



## **Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Brielmeersen' te Deinze**

### **PROCESNOTA**

ontwerp PRUP – 18 december 2019

## Colofon

### Dit document is een publicatie van:

Provincie Oost-Vlaanderen  
Gouvernementstraat 1  
9000 Gent  
Dienst Ruimtelijke Planning  
secretariaat: 09 267 75 61

### Plan-ID:

RUP\_40000\_213\_00142\_00001

### Verantwoordelijke ruimtelijk planner:

Silke Lemant  
Jolien Coppejans

### Dossierverloop

opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie	22 februari 2018
goedkeuring startnota door deputatie	9 mei 2018
raadpleging startnota	28 mei 2018 – 26 juli 2018
participatiemoment raadpleging	29 mei 2018
beslissing plan-MER door dienst MER	7 november 2018
goedkeuring scopingnota door deputatie	15 november 2018
goedkeuring voorontwerp door deputatie	29 augustus 2019
voorlopige vaststelling door provincieraad	18 december 2019
openbaar onderzoek	3 februari – 2 april 2019
goedkeuring plan-MER door dienst MER	
advies PROCORO	
definitieve vaststelling door provincieraad	

### De normatieve delen van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn:

(Deze zijn verordenend.)

- het grafisch plan
- de stedenbouwkundige voorschriften

# INHOUD

<b>1. INLEIDING.....</b>	<b>4</b>
1.1. PLANNINGSCONTEXT.....	4
1.2. PLANINHOUD.....	4
1.3. OPMAAK PRUP.....	7
1.4. BENODIGDE STUDIES.....	7
<b>2. PLANTEAM.....</b>	<b>8</b>
2.1. FUNCTIE PLANTEAM.....	8
2.2. SAMENSTELLING PLANTEAM.....	8
<b>3. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN.....</b>	<b>9</b>
<b>4. ADVIESINSTANTIES, STUURGROEP EN FORMELE DESKUNDIGEN.....</b>	<b>10</b>
4.1. ADVIESINSTANTIES.....	10
4.2. STUURGROEP.....	10
4.3. FORMELE DESKUNDIGEN.....	10
<b>5. PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES.....</b>	<b>12</b>
5.1. DOORLOPEN PROCESSTAPPEN EN GENOMEN BESLUITVORMING.....	12
5.2. GEPLANDE PROCESSTAPPEN EN VERWACHTE BESLUITVORMING.....	15
<b>6. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE.....</b>	<b>16</b>
6.1. VOORAF GEVOERDE COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE.....	16
6.2. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE IN HET KADER VAN HET PLANNINGSPROCES.....	16
6.2.1. <i>Raadpleging over de startnota</i> .....	17
6.2.2. <i>Openbaar onderzoek</i> .....	17
6.2.3. <i>Specifieke participatiemomenten</i> .....	17

# 1. INLEIDING

Voorliggend document is de procesnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Brielmeersen' te Deinze in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De procesnota beschrijft het volledige verloop van het planningsproces. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:

1. Welke actoren betrokken zijn bij het planningsproces, op welke wijze de participatie georganiseerd wordt en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie
2. Hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse Regering

## 1.1. Planningscontext

Om alle ruimtelijke ambities in het gebied tussen de Tweebruggenlaan, de Stadionlaan, de Oude Leie en het Afleidingskanaal van de Leie (ook wel Schipdonkkanaal genoemd) op elkaar af te stemmen, werken de Provincie Oost-Vlaanderen en de stad Deinze samen aan:

- een maatschappelijk gedragen masterplan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling en met aandacht voor de sociale, de ecologische en de economische implicaties
- een voorstel om het masterplan uit te voeren en te beheren


Het masterplan heeft drie grote ruimtelijke ambities:

- het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal
- een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze
- de kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum

Om het Masterplan Brielmeersen Deinze juridisch door te vertalen, is een geïntegreerd planningsproces tot opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) noodzakelijk.

## 1.2. Planinhoud

Het plangebied van het PRUP komt overeen met de kern van het projectgebied uit het Masterplan Brielmeersen Deinze. Het gaat om het gebied tussen het Afleidingskanaal van de Leie, de Oude Leie, de Tweebruggenlaan en de Stadionlaan:

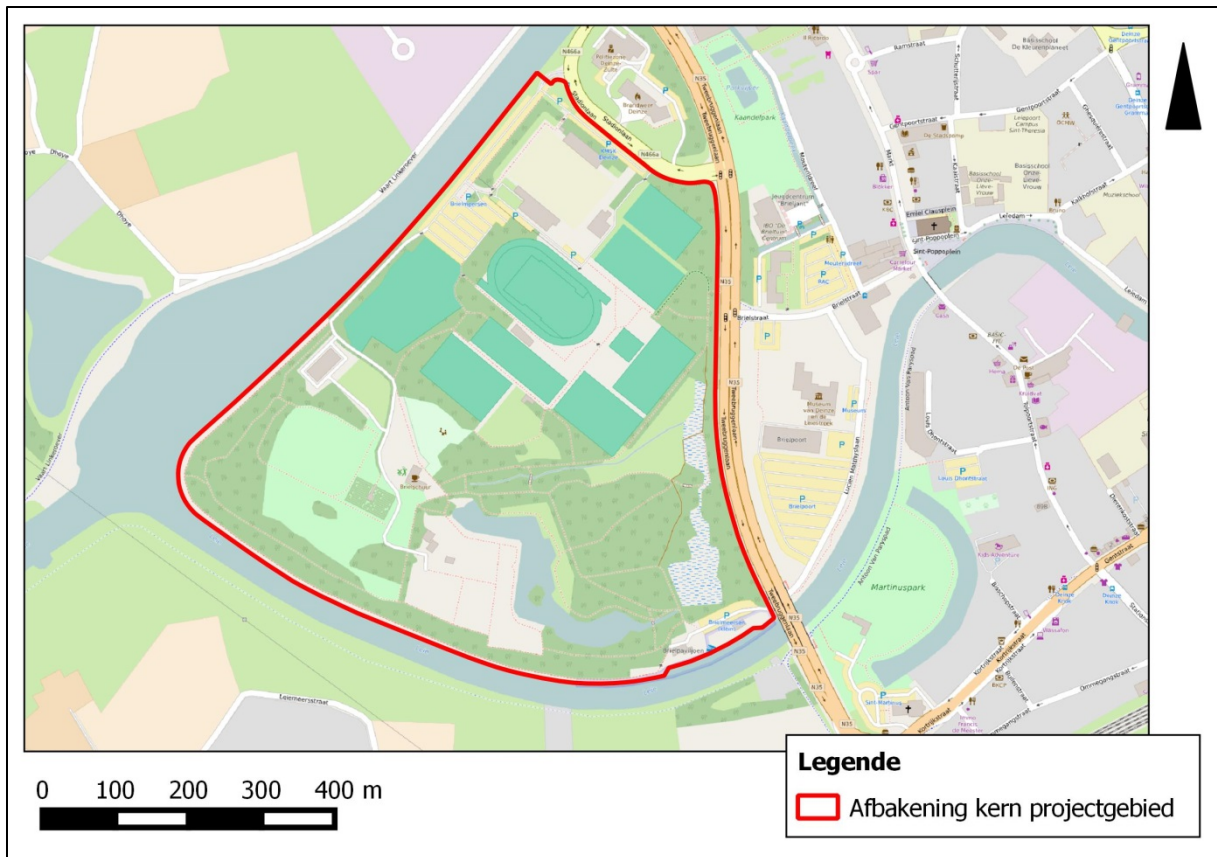

*Afbakening van het plangebied*

Het rapport van het voorkeurscenario van het Masterplan Brielmeersen Deinze vormt het inhoudelijke uitgangspunt voor het PRUP.



*Eindbeeld van het voorkeursscenario*

Het PRUP zal enkel de hoofdlijnen van het voorkeursscenario juridisch vastleggen.

Volgende elementen van het voorkeursscenario worden opgenomen in het PRUP:

- Aanduiding van de 3 globale zones, elk met hun stedenbouwkundige voorschriften:
  - o de 'stedelijke ontwikkelingszone' ten noorden van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het Afleidingskanaal van de Leie (met de stadionontwikkelingen), (met vermelding dat de 2 oefenterreinen aan het jeugdcomplex en de parking aan het Afleidingskanaal van de Leie tot 31/12/2026 kunnen behouden blijven)
  - o de 'geprogrammeerde parkrand' ten zuiden van de stedelijke as voor zacht verkeer (met de sportterreinen), (ontwikkelingen in 2<sup>e</sup> fase), (met ruimte voor de kinderboerderij, evenementenweide)
  - o het 'extensief domein'
- Aanduiding van het portaal als toegangspoort tot het volledige gebied in het verlengde van de Brielstraat en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
- Aanduiding van de stedelijke as voor zacht verkeer tussen de Brielstraat en het Afleidingskanaal van de Leie en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften
- Mogelijkheid voor private ontwikkeling van maximaal 18.000 m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte (BVO) op de stadiongrond:
  - o ontwikkeling van maximaal 15.000 m<sup>2</sup> bruto-vloeroppervlakte (BVO), te verdelen over de functies 'wonen' (maximaal 10.000 m<sup>2</sup> BVO) en 'sport- of recreatiegerelateerde activiteiten, incl. gezondheidscentrum' (maximaal 5.000 m<sup>2</sup> BVO)

- ontwikkeling van een hotel of vergelijkbare verblijfsrecreatieve functie (tijdelijk verblijf, geen domicilie mogelijk, bv. zorghotel) (maximaal 5.000 m<sup>2</sup> BVO)
- Stedenbouwkundige voorschriften die de visuele kwaliteit van het stadion en de bijhorende ontwikkelingen moeten garanderen:
  - in het bijzonder van op de Tweebruggenlaan moeten het stadion en de bijhorende ontwikkelingen visueel aantrekkelijk zijn.
  - het stadion en de bijhorende ontwikkelingen moeten als een gesloten geheel worden ervaren, zonder dat hierbij ononderbroken wanden hoger dan de tribunes worden gecreëerd. Hoogte-accenten hoger dan de tribunes zijn mogelijk.

### **1.3. Opmaak PRUP**

Op 9 februari 2017 engageerde de deputatie zich om, in het geval er voor de uitvoering van het Masterplan Brielmeersen Deinze herbestemmingen aan de orde zijn, een PRUP op te maken en daarmee te starten na de validatie van het voorkeursscenario. Om het voorkeursscenario te kunnen uitvoeren, moeten inderdaad herbestemmingen doorgevoerd worden. Aangezien het Masterplan Brielmeersen Deinze al veel informatie bevat, besliste de deputatie om het RUP in eigen beheer op te maken.

### **1.4. Benodigde studies**

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze is de opmaak van een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport (MOBER) nodig.

Op 22 juni 2017 gunde de deputatie de eerste fase voor de opmaak van deze studie aan Antea Belgium.

Op 11 april 2019 gunde de deputatie de tweede fase voor de opmaak van deze studie aan Antea Belgium.

## **2. PLANTEAM**

### **2.1. Functie planteam**

Het planteam is een ambtelijke groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijke planner en in MER-plichtige gevallen, zoals dit dossier, een afgevaardigde van de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage. De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de omvang en complexiteit van het RUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie van het RUP-planningsproces en de noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van het planteam kan wijzigen gedurende het planningsproces.

### **2.2. Samenstelling planteam**

Het planteam voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze bestaat uit:

- Twee erkend ruimtelijk planners van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Oost-Vlaanderen (Silke Lemant en Jolien Coppejans, voorheen Anne Boer)
- Een afgevaardigde van de dienst Milieueffectrapportagebeheer (Melanie Franck, voorheen Lieselotte Van Egdome)
- De MER-coördinator voor het plan-MER met MOBER voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze (Paul Arts van Antea Belgium)



### 3. BETROKKEN EN TE BETREKKEN ACTOREN

In het kader van het project is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Die analyse bevat alle al betrokken en in het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' verder te betrekken actoren. Ze is hieronder terug te vinden.

<p>HOOG</p> <p>Voelen impact van het project</p>	<p><b>ONDERSTEUNEN</b> (of laten participeren)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provinciaal recreatiedomein De Brielmeersen</li> <li>- Gebruikers van het recreatiedomein De Brielmeersen (recreanten)</li> <li>- Atletiekclub Deinze</li> <li>- Deinze Yacht Club</li> <li>- Voorzieningen in de buurt van de kern van het projectgebied (Brandweer, Politie, RAC Den Briel, Cultuurcentrum Leietheater, DC Leiespiegel, Brielpoort, Mudel, ...)</li> <li>- Potentiële toekomstige gebruikers (bv. Hondenschool Waak En Zie, Deinse Kajak Club, eventuele toekomstige bewoners, ...)</li> <li>- Bestaande handel en horeca in Deinze</li> </ul>	<p><b>MOTIVEREN</b> (co-creëren)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- K.M.S.K. Deinze (eigenaar stadiongrond)</li> <li>- De Vlaamse Waterweg NV (eigenaar deel jachthaven en waterwegbeheerder)</li> <li>- Agentschap Wegen &amp; Verkeer (wegbeheerder)</li> <li>- Departement Mobiliteit en Openbare Werken (wegbeheerder)</li> </ul>	
<p>LAAG</p>	<p><b>INFORMEREN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Departement Omgeving</li> <li>- Sectorale administraties (gemeentelijk – provinciaal – gewestelijk): Toerisme (Oost-) Vlaanderen, dienst Mer, De Lijn, ...</li> <li>- Procoro</li> <li>- Gecoro</li> <li>- Provincieraadsleden</li> <li>- Gemeenteraadsleden</li> <li>- Lokale bevolking (Deinzenaars)</li> <li>- Bevolking van de ruimere regio</li> </ul>	<p><b>OVERTUIGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stad Deinze</li> <li>- Provincie Oost-Vlaanderen (Ruimtelijke Planning – Sport &amp; Recreatiedomeinen – Patrimonium)</li> </ul>	
	<p>LAAG</p>	<p>Hebben impact op het slagen van het project</p>	<p>HOOG</p>

## **4. ADVIESINSTANTIES, STUURGROEP EN FORMELE DESKUNDIGEN**

### **4.1. Adviesinstanties**

Conform artikel 2.2.12 §2 van de VCRO en bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen zijn er voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze volgende adviesinstanties:

- PROCORO Oost-Vlaanderen
- Departement Omgeving
- College van burgemeester en schepenen van Deinze
- Agentschap voor Natuur en Bos
- Agentschap Innoveren en Ondernemen
- Agentschap Wonen-Vlaanderen
- Departement Landbouw en Visserij
- De Vlaamse Waterweg nv
- Agentschap Wegen en Verkeer
- De Lijn Oost-Vlaanderen
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken
- Sport Vlaanderen
- Toerisme Vlaanderen
- Fluxys
- Elia

### **4.2. Stuurgroep**

De beslissingen voor het Masterplan Brielmeersen Deinze worden genomen door een stuurgroep. Bedoeling is om die stuurgroep ook in te zetten voor het geïntegreerd planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze.

De stuurgroep bestaat uit leden met beslissingsrecht en permanent adviserende leden.

De leden met beslissingsrecht zijn:

- Stad Deinze
- Provincie Oost-Vlaanderen

De permanent adviserende leden zijn:

- K.M.S.K. Deinze
- De Vlaamse Waterweg nv
- Agentschap Wegen en Verkeer
- Departement Mobiliteit en Openbare Werken

### **4.3. Formele deskundigen**

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze wordt een plan-milieueffectenrapport (plan-MER) met mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opgemaakt. Hiervoor werden volgende deskundigen formeel aangeduid:

- Paul Arts: MER-coördinator en deskundige voor de disciplines 'Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie' en 'Mens (ruimtelijke aspecten)' (Antea Group)
- Inge Van der Mueren: deskundige voor de disciplines 'Bodem' en 'Water' (Antea Group)
- Koen Slabbaert: deskundige voor de discipline 'Mobiliteit' (Antea Group)
- Sofie Claerbout: deskundige voor de discipline 'Biodiversiteit' (Antea Group)
- Guy Putzeys: deskundige voor de discipline 'Geluid en trillingen' (dBA-plan)
- Dirk Dermaux: deskundige voor de discipline 'Lucht' (Antea Group)

## 5. PROCESSTAPPEN EN BESLUITVORMINGSPROCES

### 5.1. Doorlopen processtappen en genomen besluitvorming

PROCESSTAP	
BESLUITVORMING	
01/03/16 – 15/06/16	Initiatie project 'Masterplan Brielmeersen Deinze'
20/06/16	Samenwerkingsovereenkomst tussen Stad Deinze en Provincie Oost-Vlaanderen voor project 'Masterplan Brielmeersen Deinze'
01/09/16 – 31/12/16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitwerken overheidsopdracht "Opmaak Masterplan Brielmeersen Deinze"</li> <li>• Uitwerken procesverloop project 'Masterplan Brielmeersen Deinze'</li> </ul>
26/01/17	Gunning door deputatie van overheidsopdracht "Opmaak Masterplan Brielmeersen Deinze" aan BLAUWDRUK STEDENBOUW / LAMA / Orientes / ndvr
09/02/17	Goedkeuring procesnota voor project 'Masterplan Brielmeersen Deinze' en engagement voor opmaak PRUP in eigen beheer, in geval er herbestemmingen aan de orde zijn, door deputatie
21/02/17	Goedkeuring procesnota voor project 'Masterplan Brielmeersen Deinze' door college van burgemeester en schepenen
01/03/17 – 31/01/18	Uitwerken voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen Deinze
22/02/18	Goedkeuring rapport voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen Deinze door deputatie
02/18	Goedkeuring rapport voorkeursscenario voor Masterplan Brielmeersen Deinze door college van burgemeester en schepenen
17/01/18 – 15/02/18	Opmaak informatieve en evolutieve procesnota
22/02/18	Beslissing opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie

26/02/18 – 08/05/18	Opmaak startnota met voorstel inhoud plan-MER met MOBER door planteam (validatie door stuurgroep)
09/05/18	Goedkeuring startnota met voorstel inhoud plan-MER met MOBER door deputatie in functie van adviesvraag en raadpleging
28/05/18 – 26/07/18	Raadpleging en adviesvraag over startnota (60 dagen)
29/05/18	Participatiemoment in kader van raadpleging over startnota
30/07/18 – 08/11/18	Opmaak scopingnota met inhoud plan-MER met MOBER (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door planteam (validatie door stuurgroep)
15/11/18	Goedkeuring scopingnota met inhoud plan-MER met MOBER door deputatie
April – augustus 2019	Opmaak voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota en/of scopingnota) door planteam (validatie door stuurgroep)
29/08/19	Goedkeuring adviesvraag voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER (n organisatie plenaire vergadering) door deputatie
September – oktober 2019	Adviesvraag over voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER (20 dagen)
23/09/2019	Toelichting aan de PROCORO
01/10/19	Plenaire vergadering
Oktober – november 2019	Opmaak ontwerp PRUP (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota en/of scopingnota en/of aanpassen ontwerp plan-MER met MOBER) door planteam (validatie door stuurgroep)
12 november 2019	Validatie ontwerp PRUP door stuurgroep
05/12/19	Goedkeuring ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER door deputatie
10/12/19	Toelichting aan de eerste commissie

18/12/19

Voorlopige vaststelling ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER door provincieraad

## 5.2. Geplande processtappen en verwachte besluitvorming

PROCESSTAP	
BESLUITVORMING	
3 februari – 2 april 2020	Openbaar onderzoek over ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER met MOBER (60 dagen)
2 – 7 maart 2020	Infomarkt + participatiemoment in het kader van het openbaar onderzoek
April – mei 2020	Opmaak voorstel behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen openbaar onderzoek door planteam
Begin juni 2020	Behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen openbaar onderzoek door PROCORO (binnen 90 dagen na einde openbaar onderzoek)
Juni – augustus 2020	Opmaak definitief PRUP en definitief plan-MER met MOBER (en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door planteam (validatie door stuurgroep)
September 2020	Definitieve vaststelling PRUP en plan-MER met MOBER door provincieraad (binnen 180 dagen na einde openbaar onderzoek)
November 2020	Schorsingsmogelijkheid door Vlaamse regering (45 dagen)
December 2020 – januari 2021	Publicatie in Belgisch Staatsblad
Januari 2021	Inwerkingtreding PRUP (14 dagen na publicatie in Belgisch Staatsblad)

## **6. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE**

### **6.1. Vooraf gevoerde communicatie en participatie**

In het kader van de ontwikkeling van het voorkeursscenario voor het Masterplan Brielmeersen Deinze werd al een participatietraject doorlopen. Gezien de vele stakeholders die bij dit project betrokken zijn en het belang dat het projectgebied voor vele partijen heeft, was dit absoluut een meerwaarde.

De agenda werd bepaald door de stuurgroep, maar het bredere publiek kreeg de gelegenheid om problemen en oplossingen aan te brengen. Tijdens publieke participatiemomenten, kon input gegeven worden over verschillende aspecten van het masterplan. Op één moment was iedereen welkom, terwijl de andere momenten gericht waren op een bepaalde doelgroep. Hierdoor kon elke doelgroep vanuit zijn eigen insteek meedenken over het volledige projectgebied en over alle mogelijke functies.

Om input te krijgen voor de ontwikkeling van scenario's, organiseerden de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen volgende participatiemomenten:

- 3 thematische interactieve bijeenkomsten met gerichte uitnodigingen van specifieke doelgroepen: 1 rond 'natuur en educatie' (06/03/17), 1 rond 'spel' (15/03/17) en 1 rond 'sport' (29/03/17)
- Een werkatelier met de stuurgroepleden, relevante administraties en experts (28/03/17)
- Een interactieve bijeenkomst waarop iedereen welkom was (26/04/17). In het kader van dat moment werd ook breed gecommuniceerd.

Aanvullend aan het participatieproces dat door het projectbureau van de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen werd uitgewerkt en georganiseerd, voerde het ontwerpteam een reeks van gerichte diepte-interviews uit. De interviews stelden tot doel om bij het begin van de ontwerpogave een duidelijk beeld te krijgen van de verwachtingen en ambities van de verschillende stakeholders en om mogelijke spanningsvelden tijdig bloot te leggen. Dit vanuit het aanvoelen dat het combineren van recreatieve functies met andersoortige programma's een aantal uitdagingen stelt die het ontwerpteam met deze interviews beter in de vingers heeft getracht te krijgen.

Om input te krijgen voor het op punt stellen van het voorkeursscenario, organiseerden de Stad Deinze en de Provincie Oost-Vlaanderen op 17/10/17 een tweede werkatelier met de stuurgroepleden, relevante administraties en experts. Dat werkatelier leverde input op rond de thema's 'Landschap', 'Bebouwing' en 'Ontsluiting'.

### **6.2. Communicatie en participatie in het kader van het planningsproces**

In het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP 'Brielmeersen' te Deinze worden minstens twee momenten van communicatie en participatie voorzien:

- één naar aanleiding van de raadpleging over de startnota
- één naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Daarnaast kunnen aanvullend specifieke momenten van communicatie en participatie voorzien worden.



### **6.2.1. Raadpleging over de startnota**

Het eerste participatiemoment werd georganiseerd op dinsdag 29 mei 2018, aan het begin van de periode van raadpleging over de startnota. Doel van dit eerste participatiemoment was om zoveel mogelijk mensen van de intenties op de hoogte te brengen en input te laten geven. De participatiemarkt werd uitgebreid aangekondigd, onder andere online, door middel van posters en via het elektronische reclamebord op het huidige voetbalstadion. De toegang tot de markt was vrij voor alle geïnteresseerden. Aan het publiek werd de inhoud van de startnota voorgesteld aan de hand van informatieve panelen. Mensen van het planteam waren aanwezig om meer uitleg te geven. Daarnaast gaf het publiek op een interactieve manier input voor de verdere ontwikkeling van het PRUP. Ook werd duidelijk gemaakt op welke manier er inspraak mogelijk is. Van de participatiemarkt is een participatieverslag opgesteld dat gepubliceerd is op de website van de provincie.

### **6.2.2. Openbaar onderzoek**

Hoewel dit niet decretaal verplicht is, zal er ook aan het begin van het openbaar onderzoek een participatiemoment worden georganiseerd. Opnieuw zal worden gewerkt met een vrij toegankelijk en doorlopende participatiemarkt. Aan het publiek zullen de al meer concrete plannen worden voorgesteld aan de hand van informatieve panelen. Mensen van het planteam zullen aanwezig zijn om meer uitleg te geven. Daarnaast zal ook duidelijk gemaakt worden op welke manier mensen kunnen deelnemen aan het openbaar onderzoek. Ook over deze participatiemarkt zal uitgebreid worden gecommuniceerd.

### **6.2.3. Specifieke participatiemomenten**

Het is mogelijk dat er in de loop van het geïntegreerde planningsproces nog bijkomende participatiemomenten worden georganiseerd. Zeker omdat het de bedoeling is om via een participatief traject oplossingen met draagvlak te bekomen. Zo kan het zijn dat participatiemomenten voor specifieke doelgroepen worden georganiseerd, zo als dat ook gebeurd is voor de opmaak van het Masterplan Brielmeersen Deinze.
